




Schützengilde PCK Schwedt/Oder 1812 e.V.

Arbeitsplan Kugelfang – Reparatur Sandfang und Dachunterseite

14.03.2019

Termin: Freitag 12.04. – Sonntag 14.04.2019

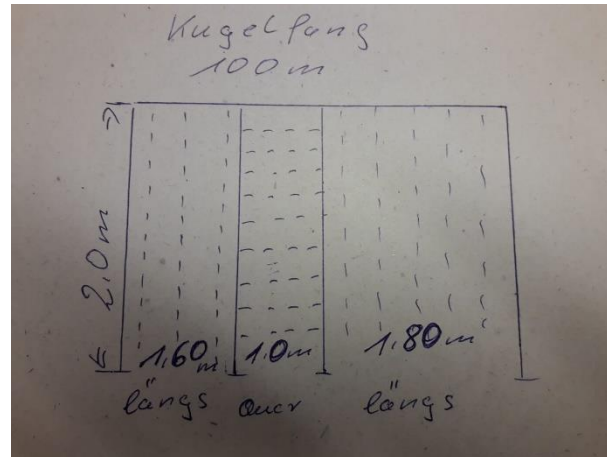

Neue Bretter quer zur alten Anordnung anbringen v.l.n.r



Erdarbeiten von rechts beginnend die Mulden ausgleichen- Material von unten und von rechts bewegen



Schützengilde PCK Schwedt/Oder 1812 e.V.

1. Tag - Freitag 12.04.2019 - Vorbereitung der Baustelle und Beginn Reparatur Dachunterseite

| | Termin | Maßnahme | Material | |
|----|--------|---|---|--|
| 1. | 09:00 | Außerbetriebnahme der Scheibenzuganlage durch Freischaltung – Entfernen der Sicherungen | Setzen roter Wimpel Schießlinie | |
| 2. | | Verlegung 120m Wasserschlauch ½“ zum Kugelfang | 4 – 5-mal 30m oder ähnlich Wassertrommel Gardena o.ä. ½“ | |
| 3. | | Verlegung Stromversorgung am Kugelfang | Kabeltrommeln, Verteiler | |
| 4. | | Transport 50m -> 100m | 5 – 10 Bahnen Filz vom 50m Stand | |
| 5. | | Transport und Bereitstellung | Holzbretter für Reparatur Dach Unterseite 3 Leitern – Basis Arbeitsplatz „Schnee“-Schieber, große Schaufeln für Erdarbeiten | |
| 6. | | v.l.n.r. Beginn Reparatur Dachunterseite | Bretter, Leisten, Filz, Holzschrauben, Akkuschauber, Ladegeräte; Leitern, Mundschutz | |
| 7. | | Versorgung | | |
| 8. | | Nach Ende der Arbeiten Rückbau der wertvollen Arbeitsmittel | Leitern, Akkuschauber, E-Verteiler | |

2. Tag - Samstag 13.04.2019 - Dachreparatur und Beginn Erdarbeiten – Ausgleich des Kugelfanghangs

| | Termin | Maßnahme | Material | |
|----|--------|---|--|--|
| 1. | 09:00 | Weiter - Außerbetriebnahme der Scheibenzuganlage durch Freischaltung – Entfernen der Sicherungen | Setzen roter Wimpel Schießlinie | |
| 2. | | Verlegung 120m Wasserschlauch ½“ zum Kugelfang | 4 – 5-mal 30m oder ähnlich Wassertrommel Gardena o.ä. ½“ | |
| 3. | | Vorbereitung Arbeitsplatz – Leitern etc. Verlegung Stromversorgung am Kugelfang | Kabeltrommeln, Verteiler | |
| 4. | | v.l.n.r. Fortsetzen Reparatur Dachunterseite – Idee Filz als Fangschutz anhängen | Bretter, Leisten, Filz, Holzschrauben, Akkuschauber, Ladegeräte; Leitern, Mundschutz | |
| 5. | | Nach Ende Rep. Dachunterseite Beginn Erdarbeiten v.r.n.l. – Die rechte Seite ist nicht so stark ausgehöhlt 1. Maßnahme abharken der Holz- und Laubbestände | 3 Leitern – Basis Arbeitsplatz „Schnee“-Schieber, große Schaufeln für Erdarbeiten | |
| 6. | | Versorgung | | |



Schützengilde PCK Schwedt/Oder 1812 e.V.

| | | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|--|
| 7. | | Nach Ende der Arbeiten Rückbau der wertvollen Arbeitsmittel | Leitern, Akkuschrauber, E-Verteiler | |
|----|--|---|-------------------------------------|--|

3. Tag - Sonntag 14.04.2019 - Dachreparatur und Beginn Erdarbeiten – Ausgleich des Kugelfanghangs

| | Termin | Maßnahme | Material | |
|----|--------|--|--|--|
| 1. | 09:00 | Weiter - Außerbetriebnahme der Scheibenzuganlage durch Freischaltung – Entfernen der Sicherungen | Setzen roter Wimpel Schießlinie | |
| 2. | | Verlegung 120m Wasserschlauch ½“ zum Kugelfang | 4 – 5-mal 30m oder ähnlich Wassertrommel Gardena o.ä. ½“ | |
| 3. | | Vorbereitung Arbeitsplatz – Leitern etc. | | |
| 5. | | Fortsetzen - Erdarbeiten v.r.n.l. Idee - Nach Erdarbeiten Hang mit Filz abdecken. | 3 Leitern – Basis Arbeitsplatz „Schnee“-Schieber, große Schaufeln für Erdarbeiten | |
| 6. | | Versorgung | | |
| 7. | | Rückbau aller Materialien und Werkzeuge | | |
| 8. | | Rücknahme der Sicherungsmaßnahmen - Inbetriebnahme und Probetrieb der Anlage | | |
